14

PROJECT MANAGEMENT PLAN

Perencanaan Manajemen Proyek

Copyright © March 2026

Project Management Plan

Dokumen kedua terpenting di awal-awal Project setelah Project Charter adalah Project Management Plan (PM Plan). Dibilang sangat penting karena ini menentukan sukses tidaknya sebuah Project.

Apa itu Project Management Plan?

Project Management Plan didefinisikan oleh PMBOK Guide :

- Sebagai dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dieksekusi, dimonitor dan dikendalikan, dan ditutup.

Sedangkan menurut buku Rita Mulcahy's PMP Exam Prep:

- Rencana pengelolaan mendokumentasikan strategi untuk mengelola proyek dan proses yang terkait dengan bidang pengetahuan tentang ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, sumber daya manusia, komunikasi, risiko, pengadaan, dan manajemen pemangku kepentingan.

Copyright © March 2026

Project Management Plan

A

Project Management Plan berisi penjelasan bagaimana rencana-rencana dan keputusan Project dijalankan.

B

PMBOK menyebut Project Management Plan sebagai “living document”, artinya jika terdapat perubahan pada rencana Project ketika Project berjalan, maka Project Management Plan juga harus diupdate.

Copyright © March 2026

Project Management Plan

Project Management Plan bersisi rencana-rencana, objective, apa saja “deliverable” yang akan diberikan ke Customer

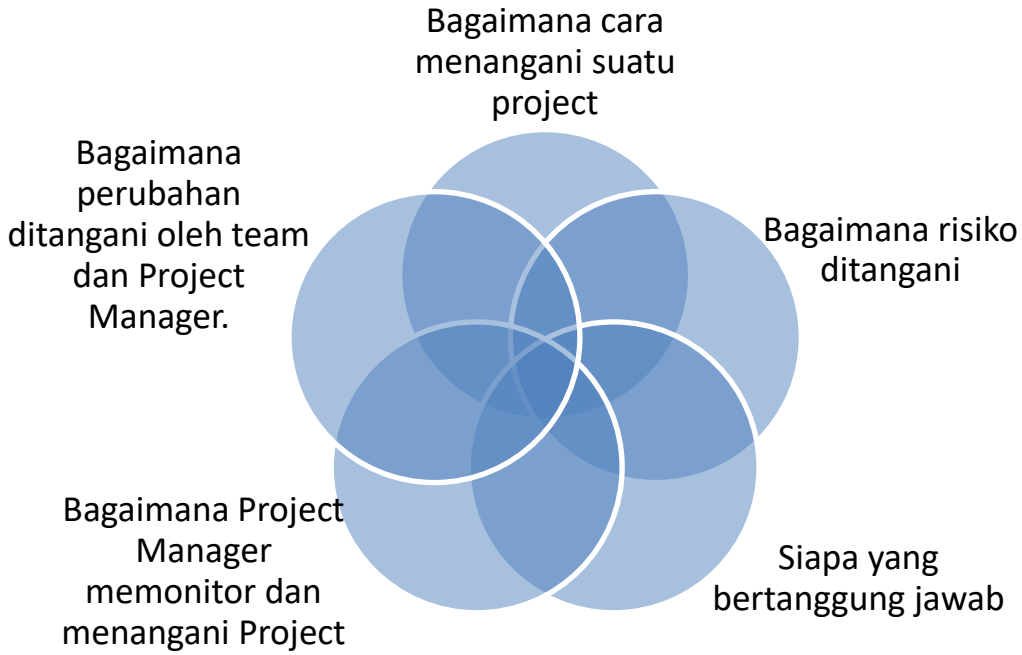

Jika kita mencoba menyederhanakan isi dari Project Management Plan, isinya berupa 4W (Why, What, Who, When) dan 1H (How).

Copyright © March 2026

Project Management Plan

Isi dokumennya Project Management Plan

1. Scope Management Plan
2. Schedule Management Plan
3. Cost Management Plan
4. Quality Management Plan
5. Human Resource Management Plan
6. Communications Management Plan
7. Risk Management Plan
8. Procurement Management Plan
9. Stakeholder Management Plan
10. Scope Baseline
11. Schedule Baseline
12. Cost Baseline

Copyright © March 2026

Project Management Plan

Project Management Plan dibuat oleh Project Manager, ditandatangani oleh Key Stakeholder, dan menjadi dasar (baseline) rencana Project. Jika terdapat perubahan, maka secara formal perubahan tersebut akan masuk ke dalam Change Control dan menjadi bahan perbandingan antara Project Actual dan Project Baseline.

Setelah Project Manager menyelesaikan dokumen Project Management Plan, selanjutnya akan diadakan Kick-Off Meeting untuk memulai Project secara resmi. Tujuan dari Kick-Off Meeting adalah untuk memberitahukan kepada Stakeholder bahwa secara resmi Project berjalan dan memberikan gambaran kepada setiap Stakeholder mengenai aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Intinya menyamakan pandangan.

Project kecil maupun besar, pembuatan dokumen Project Management Plan adalah keharusan

Copyright © March 2026

Project Management Plan

4.1 Develop Project Charter

.1 Inputs
- .1 Project statement of work
- .2 Business case
- .3 Agreements
- .4 Enterprise environmental factors
- .5 Organizational process assets

.2 Tools & Techniques
- .1 Expert judgment
- .2 Facilitation techniques

.3 Outputs
- .1 Project charter

4.2 Develop Project Management Plan

.1 Inputs
- .1 Project charter
- .2 Outputs from other processes
- .3 Enterprise environmental factors
- .4 Organizational process assets

.2 Tools & Techniques
- .1 Expert judgment
- .2 Facilitation techniques

.3 Outputs
- .1 Project management plan

Copyright © March 2026

Project Management Plan

Project Management Plan memiliki 3 baseline	**Scope Baseline:** berisi Project Scope Statement, WBS, dan WBS Dictionary
	Schedule Baseline: berisi Project Schedule yang memiliki Start Date dan End Date untuk masing-masing aktivitas.
	Cost Baseline: berisi Project Budget.

Ketiga baseline tersebut biasa disebut juga sebagai Performance Measurement Baseline, karena Project Manager akan selalu membandingkan antara Project yang berjalan dengan baseline tersebut. Performance ini kemudian akan menjadi report kepada

Copyright © March 2026

Project Management Plan

Stakeholder mengenai kondisi Project, apakah masih in scope atau out of scope, apakah under, within atau over budget, dan apakah behind, on, atau ahead schedule.

Setiap ada perubahan terkait dengan baseline selama Executing dan Monitoring & Controlling, maka perubahan tersebut akan masuk ke dalam Change Control System. Jika disetujui, maka Project Manager dapat mengupdate baseline di dalam Project Management Plan.

Copyright © March 2026

Diskusi Pembahasan Dokumen

Pada pertemuan 14 ini dosen menunjuk salah satu kelompok yang terbaik untuk menyampaikan tugasnya di depan kelas untuk dilakukan pembahasan dokumen Project Management Plan.

Copyright © March 2026

LATIHAN MATERI (LM)			
PENUGASAN	**PERTEMUAN - 14**	PENGUMPULAN	**AKHIR PERTEMUAN - 14**
KETENTUAN :			
1. GUNAKAKAN KERTAS A4			
2. DITULIS TANGAN / NON-KOMPUTER			
3. DIBERI NAMA, NIM, KELAS, NO.ABSEN			

1. Apa yang dimaksud dengan Project Management Plan
2. Sebutkan elemen dari Project Management Plan
3. Apa perbedaan anatara Project Charter dengan Project Management Plan

Copyright © March 2026

CATATAN PENGUAT MATERI KULIAH

Soal Latihan dan Soal ujian dapat dari sumber materi slide tiap pertemuan dan ditambah dari luar slide pertemuan (dari buku-buku referensi) maka Mahasiswa diharapkan membaca dan mencari materi tambahan yang masih terkait dengan topik pertemuan dari sumber referensi buku Manajemen Proyek Sistem Informasi untuk menambah wawasan keilmuan agar nantinya dapat menjawab soal-soal latihan maupun soal ujian yang sumbernya bukan berasal dari slide pertemuan.

Copyright © March 2026
