04

Document & Communication

Dokumen dan Komunikasi Proyek

Copyright © March 2026

Mengelola Komunikasi Proyek

Bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan sering menjadi faktor kunci yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merasa puas bahkan ketika perubahan yang tidak terduga terjadi.

Kegiatan mengelola Komunikasi

01

Merencanakan Manajemen Komunikasi. Menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder, seperti surat edaran investor, pembaruan kemajuan, perubahan proyek.

02

Mengatur Komunikasi.

Selama pelaksanaan proyek, rencana komunikasi dipraktekkan dan komunikasi dikelola secara aktif.

03

Mengontrol Komunikasi.

Selama titik-titik status reguler, komunikasi proyek ditinjau dan revisi rencana komunikasi dimulai.

Copyright © March 2026

ITTOs Project Communications Management

Project Communications Management Overview

10.1 Plan Communications Management

.1 Inputs
- .1 Project charter
- .2 Project management plan
- .3 Project documents
- .4 Enterprise environmental factors
- .5 Organizational process assets

.2 Tools & Techniques
- .1 Expert judgment
- .2 Communication requirements analysis
- .3 Communication technology
- .4 Communication models
- .5 Communication methods
- .6 Interpersonal and team skills
- .7 Data representation
- .8 Meetings

.3 Outputs
- .1 Communications management plan
- .2 Project management plan updates
- .3 Project documents update

10.2 Manage Communications

.1 Inputs
- .1 Project management plan
- .2 Project documents
- .3 Work performance reports
- .4 Enterprise environmental factors
- .5 Organizational process assets

.2 Tools & Techniques
- .1 Communication technology
- .2 Communication methods
- .3 Communication skills
- .4 Project management information system
- .5 Project reporting
- .6 Interpersonal and team skills
- .7 Meetings

.3 Outputs
- .1 Project communications
- .2 Project management plan updates
- .3 Project documents updates
- .4 Organizational process assets updates

10.3 Monitor Communications

.1 Inputs
- .1 Project management plan
- .2 Project documents
- .3 Work performance data
- .4 Enterprise environmental factors
- .5 Organizational process assets

.2 Tools & Techniques
- .1 Expert judgment
- .2 Project management information system
- .3 Data representation
- .4 Interpersonal and team skills
- .5 Meetings

.3 Outputs
- .1 Work performance information
- .2 Change requests
- .3 Project management plan updates
- .4 Project documents updates

Copyright © March 2026

DOKUMEN PROYEK

Phase	Project Documents
Initiating	Project Charter
Planning	Project Management Plan
Execution	Status Updates Stakeholder Communications
Monitoring	Variance analysis Project change documentation
Closing	Final reporting

Copyright © March 2026

Project charter, yang kadang disebut Project Overview Statement (POS) alias ikhtisar proyek

Copyright © March 2026

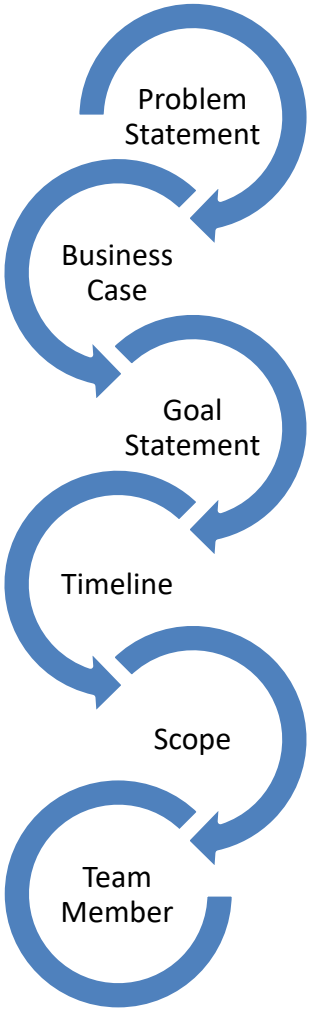

PROJECT CHARTER

merupakan dokumen bertanda tangan yang secara resmi mendefinisikan serta mengesahkan sebuah proyek. Oleh karena itu, project charter ini dibuat tentu saja setelah proposal proyeknya disetujui.

Tanpa project charter, tujuan proyek akan menjadi ambigu dan kadang tidak dipahami secara benar oleh para stakeholder. Masing-masing mungkin saja memiliki sudut pandang yang berbeda

Copyright © March 2026

Komponen Project Charter (sederhana)

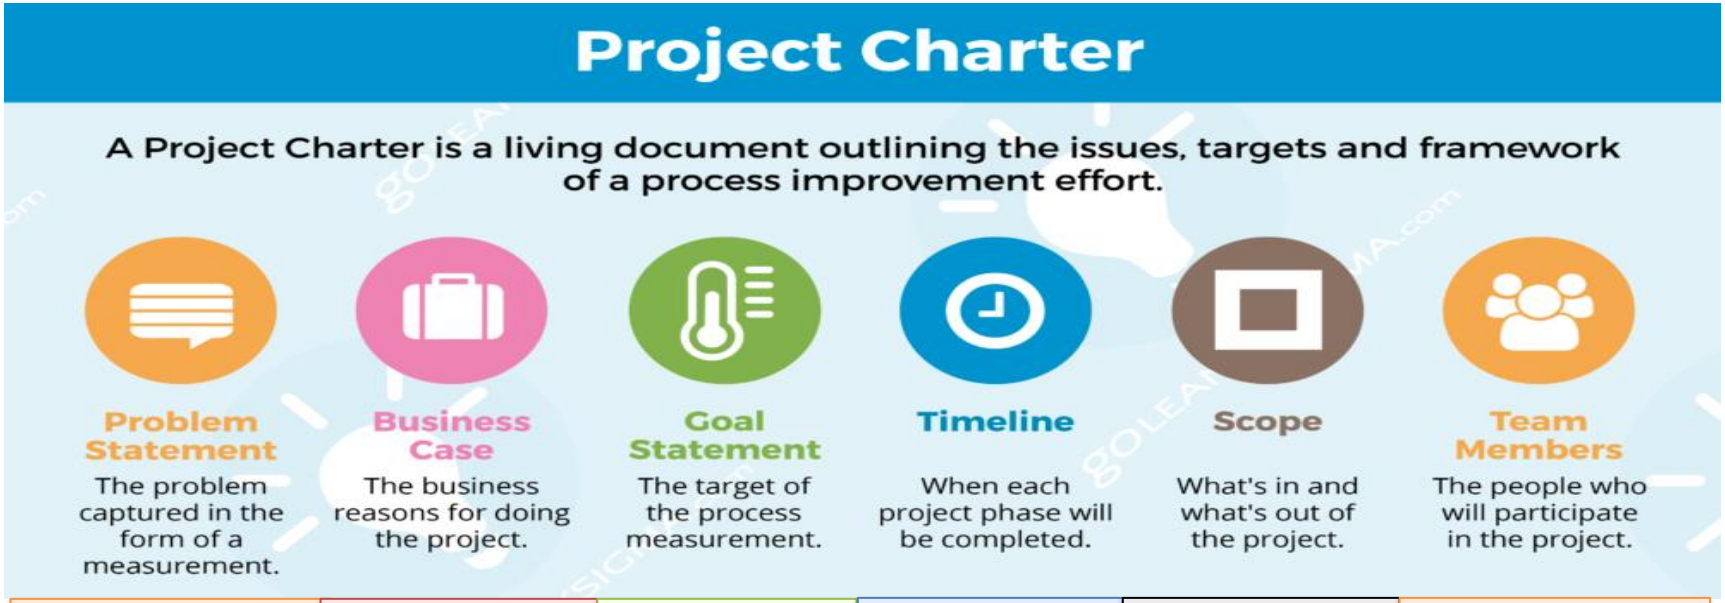

Masalah ditangkap dalam bentuk pengukuran	Alasan bisnis untuk menjalankan proyek	Target pengukuran proses	Kapan setiap fase proyek akan selesai	Apa yang ada dan apa yang keluar dari proyek	Orang-orang yang akan berpartisipasi dalam proyek ini

Copyright © March 2026

Project Charter Component

- Otorisasi proyek.
- Penunjukan manajer proyek.
- Stakeholder utama.
- Tujuan.
- Asumsi proyek.
- Kebutuhan produk.
- Pernyataan cakupan..
- Prioritas.
- Batasan-batasan proyek
- Risiko proyek.
- Daftar Deliverable atau produk.
- Estimasi biaya.
- Kriteria keberhasilan.
- Kontrol perubahan terintegrasi.
- Estimasi jadwal.

Copyright © March 2026

CONTOH

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERPUSTKAAN BERBASIS WEB

PROJECT CHARTER

Copyright © March 2026

INFO GLOBAL

Nama Proyek	:	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB
Pemilik Proyek	:	Syaiful Anwar
Manajer Proyek	:	Asfani Aniya Sahid
Global Proyek		
Deskripsi Singkat	:	Membangun Sistem Informasi Pelayanan Perpustakaan berupa Peminjaman dan Pengembalian Buku Berbasis Web
Predecessor	:	-
Successor	:	-

A. Permasalahan

Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai permasalahan bisnis :

Pepustakaan merupakan fasilitas yang sangat penting dalam menunjag dalam lembaga pendidikan. Kualitas pelayanan menjadi titik sentral perpustakaan. Seiring dengan era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital berdampak pada layanan Library perpustakaan. Adanya gap diera digital dengan sistem yang ada di perpustakaan dimana data anggota, buku, transaksi peminjaman, pengembalian dan denda belum terintegrasi mengakibatkan kecepatan layanan terhambat, informasi buku, pengolahan transaksi belum berjalan dengan maksimal. Berpijak pada peningkatan kualitas kinerja SDM dan pelayanan perpustakaan, solusi melalui pengembangan sistem berbasis digital menjadi acuan paling tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi.

Copyright © March 2026

B. Deskripsi Produk / Servis

Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau servis :

- Data Buku
- Data Anggota
- Transaksi Peminjaman
- Transaksi Pengembalian + Denda
- Laporan (Buku, Anggota, Transaksi)
- Jumlah Buku
- Jumlah Anggota
- Jumlah Transaksi
- Peminjaman Selesai
- Info Buku
- Info Anggota Baru
- Info Peminjaman Terakhir

C. Faktor Penentu Keberhasilan

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proyek dan faktor-faktor yang bisa menghambat proyek:

- Komitmen dan hubungan dari pihak manajemen
- Komitmen dan dukungan dari tim proyek
- Ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompentensi masing-masing
- Kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek
- Kontinuitas pelaksanaan proyek (tanpa adanya interupsi)
- Disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek
- Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap
- Tersedianya semua fasilitas pendukung proyek sesuai dan memadai

Copyright © March 2026

D. Keuntungan yang Diharapkan

Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan:

Dari sisi admin perpustakaan

- Mempermudah penyimpanan data perpustakaan
- Mempermudah menginput data anggota
- Mempermudah Transaksi Peminjaman, Pengembalian + Denda
- Mempermudah mendapat informasi Buku, Anggota, Transaksi
- Mempermudah mencetak Kartu Anggota
- Mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya

Dari sisi pemakai

- Mempermudah Pencarian buku + Info Buku
- Mempermudah Pelayanan Pendafataran
- Mempermudah Pelayanan Peminjaman
- Mempermudah Pelayanan Pengembalian

E. Teknologi yang digunakan

Berikut ini adalah sekilas tentang teknologi yang digunakan untuk keperluan proyek:

Teknologi yang digunakan untuk membangun sistem informasi kepegawaian ini secara garis besar dapat dibagi ke dalam beberapa bagian berikut ini:

Komputer Server : Pentium 4

Komputer Client : Pentium 3

Sistem Operasi Komputer Server : Windows Server

Sistem Operasi Komputer Client : Window 7

Software Development : Codeigniter

Database : MySql

Copyright © March 2026

F. Deskripsi Proyek

Berikut ini adalah deskripsi proyek secara umum (high-level) yang meliputi:

F1. Tujuan Proyek :

Tujuan proyek ini adalah membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan pelayanan kesehatan.

F2. Hasil yang Diinginkan:

- Mengeluarkan info Jumlah Buku, Jumlah Anggota, Jumlah Transaksi, dan Transaksi Selesai (pengembalian)
- Mengeluarkan info Buku, info Anggota Baru, info Pemnijaman Terakhir
- Memberikan info denda
- Mencetak dokumen laporan (Kartu, Buku, Transaksi)

F3. Jadwal :

Proyek dikerjakan selama kurun waktu 115 hari, yaitu :

- Membangun Sistem dan segala kegiatan pendukungnya
- Perawatan selama kurung waktu tertentu
- Pertemuan (meeting awal, meeting reguler tim proyek, dan meeting penutupan)

F4 Estimasi/ Perkiraan Biaya:

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah Rp.75.000.000

F5. Estimasi Sumber Daya yang Diperlukan:

- Sumber daya secara global terdiri atas:
- Sumber daya manusia: 8 orang anggota tim proyek (1 orang merangkap pekerjaan) +1 orang manajer proyek
- Materi/ Alat: printer, Insfrastruktur pendukung proyek
- Komputer server dan komputer client sudah tersedia (tidak termasuk dalam anggaran biaya)

Copyright © March 2026

G. Perencanaan Aktivitas secara Global

Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global

Nomor	Deskripsi Aktivitas	Jumlah Hari	Estimasi Biaya
1	Analisa & Desain Sistem	9 hari	4 Juta
2	Desain Aplikasi	7 hari	2 Juta
3	Pemrograman	55 hari	22 Juta
4	Testing	5 hari	2 Juta
5	Instalasi	2 hari	2 Juta
6	Dokumentasi	70 hari	7 Juta
7	Training	2 hari	1 Juta
8	Administrasi	80 hari	6 Juta
9	Pemeliharaan	20 hari	2 Juta
10	Tambahan Kerja + Meeting + Lain2	15 hari	28 Juta
	TOTAL	**115 hari**	**75 Juta**

H. Batasan

Berikut ini adalah batasan-batasan proyek secara umum:

- Fokus proyek adalah pada pembangunan atau pembuatan sistem informasi sampai dengan pemeliharaan dalam kurun waktu tertentu
- Tidak dibahas mengenai quality control & quality assurance secara khusus
- Tidak dibahas mengenai risiko proyek, bahasan hanya pada risiko permintaan perubahan (akan ditangani secara khusus di manajemen perubahan)
- Biaya yang dimaksud adalah biaya untuk tim proyek (tidak termasuk manajer proyek) + biaya lain-lain (bahan, infrastruktur pendukung,dll)

Copyright © March 2026

I. Asumsi

Berikut ini adalah asumsi-asumsi proyek secara umum:

- Procurement atau pengadaan sudah tidak ada masalah, sumber daya non-personil sudah tersedia dan sesuai dengan spesifikasi proyek
- Human resource atau sumber daya manusia sudah tersedia sesuai dengan spesifikasi proyek yang akan dikerjakan
- Anggota tim proyek adalah SDM profesional yang disewa untuk keperluan proyek
- Manajer proyek adalah personil dari dalam perusahaan itu sendiri
- Struktur organisasi sudah diterapkan
- Pemilik proyek & manajer proyek sudah ditunjuk/ditetapkan beserta anggota tim proyek

Copyright © March 2026

TUGAS MANDIRI [TM]			
PENUGASAN	**PERTEMUAN - 04**	PENGUMPULAN	**AWAL PERTEMUAN - 05**
KETENTUAN :			
1. GUNAKAKAN KERTAS A4			
2. DITULIS TANGAN / NON-KOMPUTER			
3. DIBERI NAMA, NIM, KELAS, NO.ABSEN			

Berdasarkan PMBOK Edisi 5

Sebutkan 47 Proses Project Management (dalam bahasa Indonesia)

Copyright © March 2026

CATATAN PENGUAT MATERI KULIAH

Soal Latihan dan Soal ujian dapat dari sumber materi slide tiap pertemuan dan ditambah dari luar slide pertemuan (dari buku-buku referensi) maka Mahasiswa diharapkan membaca dan mencari materi tambahan yang masih terkait dengan topik pertemuan dari sumber referensi buku Manajemen Proyek Sistem Informasi untuk menambah wawasan keilmuan agar nantinya dapat menjawab soal-soal latihan maupun soal ujian yang sumbernya bukan berasal dari slide pertemuan.

Copyright © March 2026
